

PROYECTOS REGISTRADOS EN EL BANCO DE INVERSIONES POR LA UNAAA (SEDE CENTRAL)



PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE NEGOCIOS INTERNACIONALES Y TURISMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE ALTO AMAZONAS DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO, CUI:2479114

FECHA DE REGISTRO: 27/01/2020-16:28:27

FECHA DE VIABILIDAD: 27/01/2020-20:03:50



2025

LA INVERSIÓN AUN NO INICIA ESTA FASE.

PMI

Formulación y evaluación

Fase de ejecución

Funcionamiento

ESTA CONTEMPLADO EN EL PMI 2026-2028, CON UN COSTO DE INVERSIÓN DE: S/ 12,578,302.56

2020




FECHA DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO: 12/07/2023 APROBADA MEDIANTE RESOLUCION PRESIDENCIAL N° 241-2023-UNAAA/P.

FECHA DE INICIO DE OBRA: 08/01/2024

AL LA FECHA CUENTA CON UN AVANCE DE EJECUCION AL 88.79%





IOARR: RENOVACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; ADQUISICION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE ALTO AMAZONAS DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO, CUI: 2503097


FECHA DE REGISTRO:05/11/2020-13:27:40

FECHA DE APROBACION:09/11/2020-09:44:29



2025

LA INVERSIÓN AUN NO INICIA ESTA FASE.



ESTA CONTEMPLADO EN EL PMI 2026-2028, CON UN COSTO DE INVERSION DE: S/ 5,176,501.03

2020



FECHA DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO:06/03/2025 APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA N° 241-2023-UNAAA/P.

ACTUALMENTE LA UNAAA VIENE REALIZANDO LOSTRABAJOS DE ACTOS PRERATORIOS



**IORR: REMODELACION DE AMBIENTE
COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE
EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS;
EN EL(LA) COMEDOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE ALTO AMAZONAS EN LA LOCALIDAD
YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS,
PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO
LORETO, CUI: 2503577**


**FECHA DE
REGISTRO:11/11/2020
13:20:00**

**FECHA DE
APROBACION:11/11/20
20 13:56:08**



2025

**LA INVERSIÓN AUN NO
INICIA ESTA FASE.**

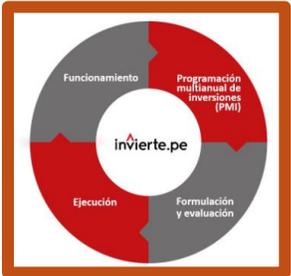

PMI

Formulación y evaluación

Fase de ejecución

Funcionamiento

**ESTA CONTEMPLADO EN
EL PMI 2026-2028, CON
UN COSTO DE
INVERSION DE:
815,495.53**

2020



**ACTUALMENTE SE VIENE
REALIZANDO LA
REFORMULACION Y
ACTUALIZACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO**





IOARR: RENOVACION DE ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE ALTO AMAZONAS EN LA LOCALIDAD YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO, CUI: 2503801

FECHA DE REGISTRO:
13/11/2020 10:32:51

FECHA DE APROBACION:
13/11/2020 11:18:23



LA INVERSIÓN AUN NO INICIA ESTA FASE.



2025


ESTA CONTEMPLADO EN EL PMI 2026-2028, CON UN COSTO DE INVERSIÓN DE: S/ 5,843,017.63



ACTUALMENTE SE CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO, EL CUAL NO CUENTA CON PRECIOS ACTUALIZADOS.




PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE ALTO AMAZONAS DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO, CUI: 2549955



FECHA DE REGISTRO:
05/05/2022 12:16:57

FECHA DE VIABILIDAD:
05/05/2022 14:30:50



2025

LA INVERSIÓN AUN NO INICIA ESTA FASE.

PMI

Formulación y evaluación

Fase de ejecución

Funcionamiento

ESTA CONTEMPLADO EN EL PMI 2026-2028, CON UN COSTO DE INVERSIÓN DE: S/ 13,496,510.93

2022



FECHA DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO:18/07/2023 APROBADA MEDIANTE RESOLUCION PRESIDENCIAL N° 254-2023-UNAAA/P.

FECHA DE INICIO DE OBRA:10/01/2024

EL PROYECTO COMPRENDIA UN PLAZO CONTRACTUAL DE 90 DIAS CALEDARIOS, ACTUALMENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ARBITRAJE



tu viaje hacia el éxito comienza aquí.

Más información en:
www.unaaa.edu.pe
admision.autonoma@unaaa.edu.pe



PIP. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE ALTO AMAZONAS EN LA LOCALIDAD DE YURIMAGUAS - DISTRITO DE YURIMAGUAS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEL DEPARTAMENTO DE LORET, CUI: 2577395

FECHA DE REGISTRO:
07/03/2023 12:25:24

FECHA DE VIABILIDAD:
08/03/2023 13:04:47



ESTA CONTEMPLADO EN EL PMI 2026-2028, CON UN COSTO DE INVERSIÓN DE: S/ 10,719,544.76



2025

LA INVERSIÓN AUN NO INICIA ESTA FASE.

ACTUALMENTE EL PROYECTO SE ECUENTRA VIABLE CONTANDO CON UN COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE S/ 432,340.20.





IOARR: CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO Y TRANSFORMADOR DE POTENCIA; EN EL(LA) SEDE CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE ALTO AMAZONAS, LOCALIDAD DE YURIMAGUAS - DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO, CUI: 2645050

FECHA DE REGISTRO:
15/04/2024 16:49:32

FECHA DE APROBACION:
30/04/2024 16:49:44



2025

LA INVERSIÓN AUN NO INICIA ESTA FASE.

PMI


Formulación y evaluación

Fase de ejecución

Funcionamiento

ESTA CONTEMPLADO EN EL PMI 2026-2028, CON UN COSTO DE INVERSION DE: S/ 2,485,584.70

2024



ACTUALMENTE EL PROYECTO SE ECUENTRA APROBADO CONTANDO CON UN COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE S/ 67,177.96.



IOARR: REMODELACIÓN DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO; ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA; EN EL(LA) ESCUELA DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE ALTO AMAZONAS DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO” CON CUI: 2693838



FECHA DE REGISTRO:
09/05/2025 17:18:34

FECHA DE APROBACION:
12/05/2025 17:29:03



2025

LA INVERSIÓN AUN NO INICIA ESTA FASE.



NO ESTA EN EL PMI 2026-2028, Y DEMANDA UN COSTO DE INVERSIÓN DE:
S/ 281,358.53



2025

ACTUALMENTE EL PROYECTO SE ECUESTRA APROBADO CONTANDO CON UN COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE S/ 7,962.98.



PROYECTOS REGISTRADOS EN EL BANCO DE INVERSIONES POR LA UNAAA (SUB SEDE MUNICHIS)



IOARR: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE ALTO AMAZONAS EN LA LOCALIDAD MUNICHIS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO, CUI: 2502947

FECHA DE REGISTRO:
04/11/2020
11:12:32

FECHA DE APROBACION:
04/11/2020 12:11:15



2025

LA INVERSIÓN AUN NO INICIA ESTA FASE.



ESTA CONTEMPLADO EN EL PMI 2026-2028, CON UN COSTO DE INVERSION DE: S/ 1,663,722.00

2020



ACTUALMENTE SE CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO, EL CUAL NO CUENTA CON PRECIOS ACTUALIZADOS.



PIP: CREACION DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA UNIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS Y URBANISTICOS EN LA SUBSEDE MUNCHIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE ALTO AMAZONAS, LOCALIDAD DE MUNCHIS - DISTRITO DE YURIMAGUAS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO, CUI:2578315



FECHA DE REGISTRO:
14/03/2023 10:03:44

FECHA DE VIABILIDAD:
16/03/2023 12:12:31



2025

LA INVERSIÓN AUN NO INICIA ESTA FASE.

PMI

Formulación y evaluación

Fase de ejecución

Funcionamiento

ESTA CONTEMPLADO EN EL PMI 2026-2028, CON UN COSTO DE INVERSIÓN DE: S/ 72,208,674.88

2023



ACTUALMENTE EL PROYECTO SE ECUESTRA VIABLE CONTANDO CON UN COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE S/ 1,930,713.23.



PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE ZOOTECNIA, AGRONOMÍA, CIENCIAS BIOLÓGICAS Y ACUICULTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE ALTO AMAZONAS, EN LA LOCALIDAD DE MUNICHIS DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO, CUI: 2596600



FECHA DE REGISTRO:
31/05/2023 14:16:50

FECHA DE VIABILIDAD:
06/06/2023 12:35:05



2025

LA INVERSIÓN AUN NO INICIA ESTA FASE.

PMI

Formulación y evaluación

Fase de ejecución

Funcionamiento


ESTA CONTEMPLADO EN EL PMI 2026-2028, CON UN COSTO DE INVERSIÓN DE: S/ 33,991,897.64.

2023



ACTUALMENTE EL PROYECTO SE ECUESTRA VIABLE CONTANDO CON UN COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE S/ 1,166,128.61.





PIP: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE ALTO AMAZONAS DISTRITO DE YURIMAGUAS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO, CUI: 2635595

FECHA DE REGISTRO:
26/02/2024 09:49:50

FECHA DE VIABILIDAD:
27/02/2024 13:16:03



2025

LA INVERSIÓN AUN NO INICIA ESTA FASE.




ESTA CONTEMPLADO EN EL PMI 2026-2028, CON UN COSTO DE INVERSIÓN DE: S/ 43,988,787.73.

2024



ACTUALMENTE EL PROYECTO SE ECUENTRA VIABLE CONTANDO CON UN COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE S/ 1,174,044.42





PIP: CREACION DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE ALTO AMAZONAS, LOCALIDAD DE MUNICHIS - DISTRITO DE YURIMAGUAS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO:

2642828

FECHA DE REGISTRO:
27/03/2024 15:55:27

FECHA DE VIABILIDAD:
27/03/2024 20:02:19



2025

LA INVERSIÓN AUN NO INICIA ESTA FASE.



ESTA CONTEMPLADO EN EL PMI 2026-2028, CON UN COSTO DE INVERSIÓN DE: S/ 8,853,602.09.



2024

ACTUALMENTE EL PROYECTO SE ECUENTRA VIABLE CONTANDO CON UN COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE S/ 230,876.70.

